


# Aakonmajan maastopyöräreitti 4,6 km

## Valmiusaste kartta

11.7.2020

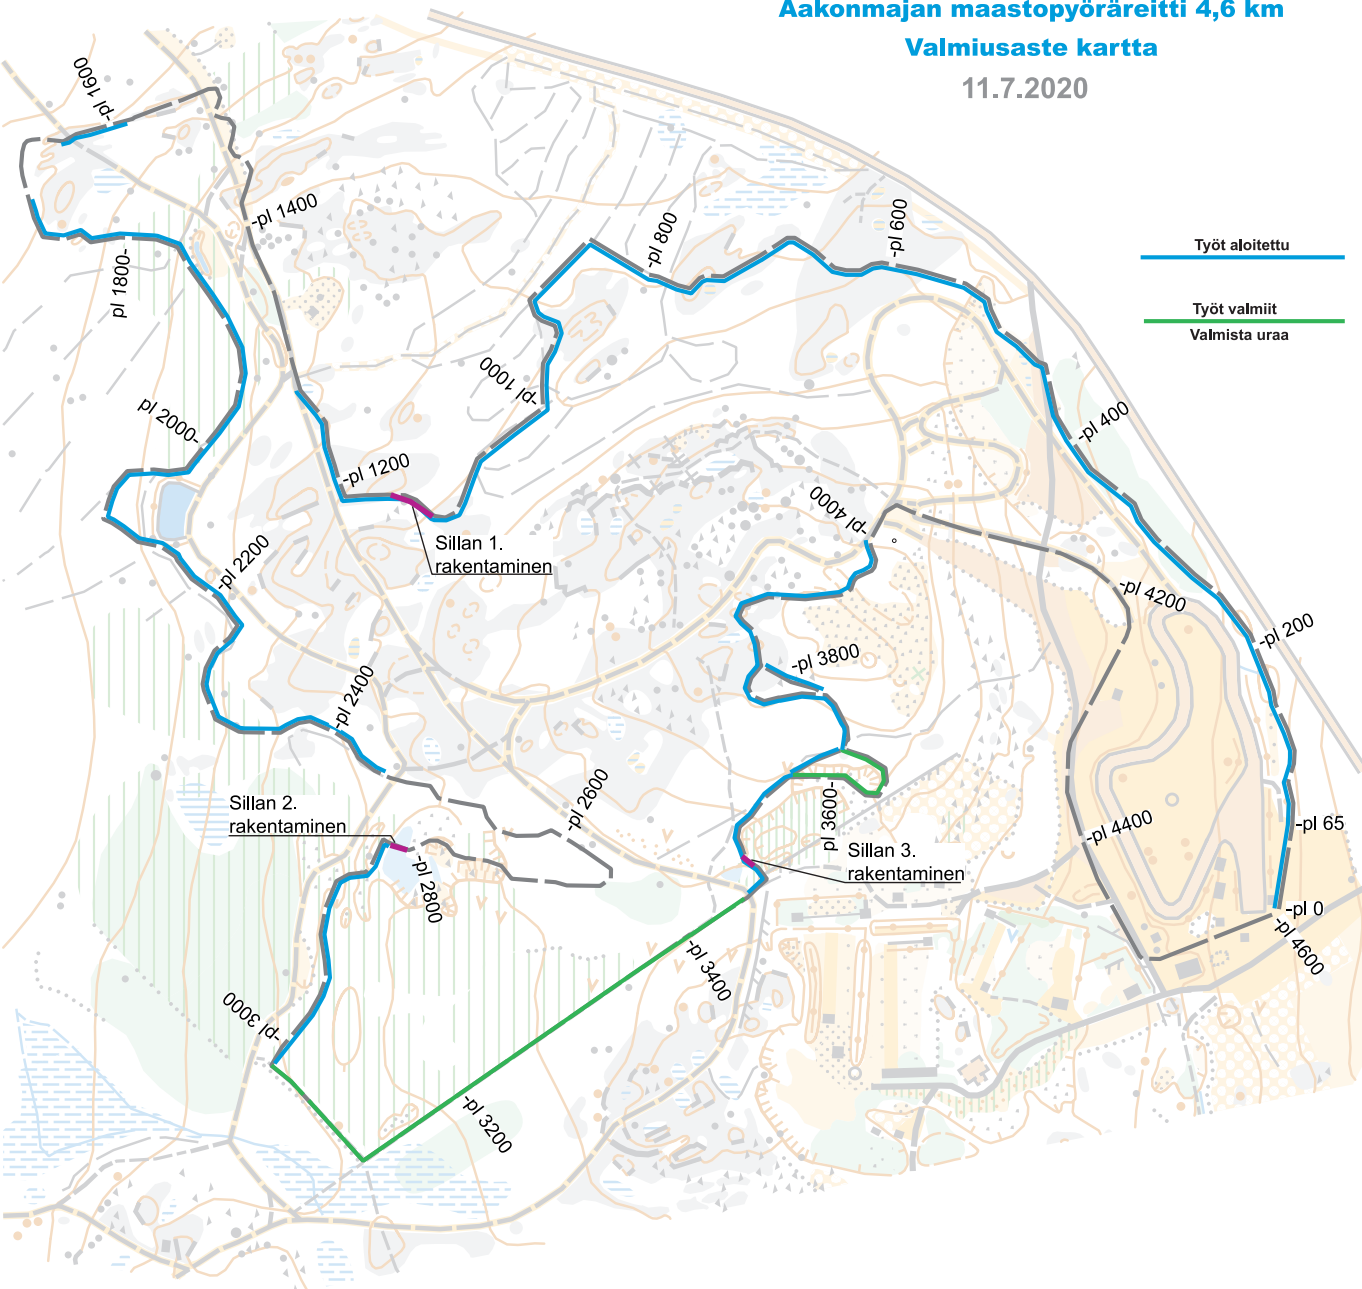

Paalulukema	Työselite
65-450	<b>Kaivurilla pohjan läpikäynti 3 metriä leveästi</b> Mursketta pintaan <b>Risujen poisto, ympäristön siistminen</b>
470	Rumpu tai silta kosteikon ylitykseen <b>+täytemaata</b> ja mursketta
450-500	<b>Kaivinkoneella pajukon poisto</b> , uran muotoilu
500-1275	<b>Uran muodostaminen</b> kuluttamalla, (mönkijä/motocross) <b>Risujen raivausta, kantojen sahaus matalammaksi</b> , mursketta koloihin mönkijällä
750	Pieni kallion ylitys rakennelma puusta/kivistä
950	<b>Kalliolta sammaleen poisto</b>
1125	(1.) Kulkusillan rakentaminen puusta, pituus noin 30 metriä, leveys 2metriä?
1425-1525	Lonkero mutkien rakentaminen kavinkoneella Täytemaata 150-200m3+ mursketta pintaan
1525-1600	Uran muodostaminen kuluttamalla, sammaleen poisto
1600-1630	Kaivurilla pientä muotoilua, <b>risujen raivausta</b> , lyhyeen pehmeikköön maata tai mursketta
1630-1700	<b>Kalliolta sammaleen poisto</b> Pientä kalliokolojen täyttöä murskeella, uran kulutus
1700-2450	<b>Pohjan tasaus kaivinkoneella</b> , tarvittaessa mursketta Kantojen lyhentäminen sahaamalla Uran muodostaminen kuluttamalla, (mönkijä/motocross)
2450-2725	Risujen raivaus, kantojen madallus Uran muodostaminen kuluttamalla, (mönkijä/motocross)
1750/2100-2130	<b>Puun kaatoa</b>
2725-2850	Puiden kaatoa Soramonttu, pohjan tasaus miestyönä Tarvittaessa pintaan mursketta
2825	(2.) Juhasillan rakentaminen puusta, <b>Kaivurilla kivistä perustuksia veteen</b> Sillan pituus 10 metriä, leveys 2 metriä ?
2850-3020	Risujen <b>raivaus, kantojen madallaminen</b> Uran muodostaminen kuluttamalla, (mönkijä/motocross)
3020-3100	<b>Valmis polku</b> , pehmeisiin kohtiin mahdollisesti mursketta
3100-3450	<b>Valmis polku, uran loventaminen raivaussahalla</b> <b>Puiden alaosien poistoa</b>
3450-3500	<b>Puun kaato ja</b> pienehkön (3.) sillan teko <b>Alku pehmeikköön kaivurilla murske</b> täyttöä Uran muodostaminen kuluttamalla, (mönkijä/motocross)
3500-3570	<b>Valmis metsäkoneura, risujen poistoa, kantojen madallus</b>
3570-3700	<b>Teknisempi pätkä, vanhan soramontun pohjan tasaus miestyönä,</b> <b>Samalle kohdalle myös oikeisupätkä</b>
3700-4025	<b>Uran muodostaminen</b> kuluttamalla, (mönkijä/motocross) Muraketta koloihin
3800	<b>Teknisempi pätkä</b> , miestyönä kivien asettelu, myös tasaisempi kiertoreitti
4000	Frisbee radasta varoitus kyltti, samoin mahdollinen vauhdin himmaus kohta reitille
0-4600	Uran merkkkaus maastoon
