


# Aakonvuoren xc maastopyöräreitti 4,6 km

## Valmiusaste kartta

19.7.2020

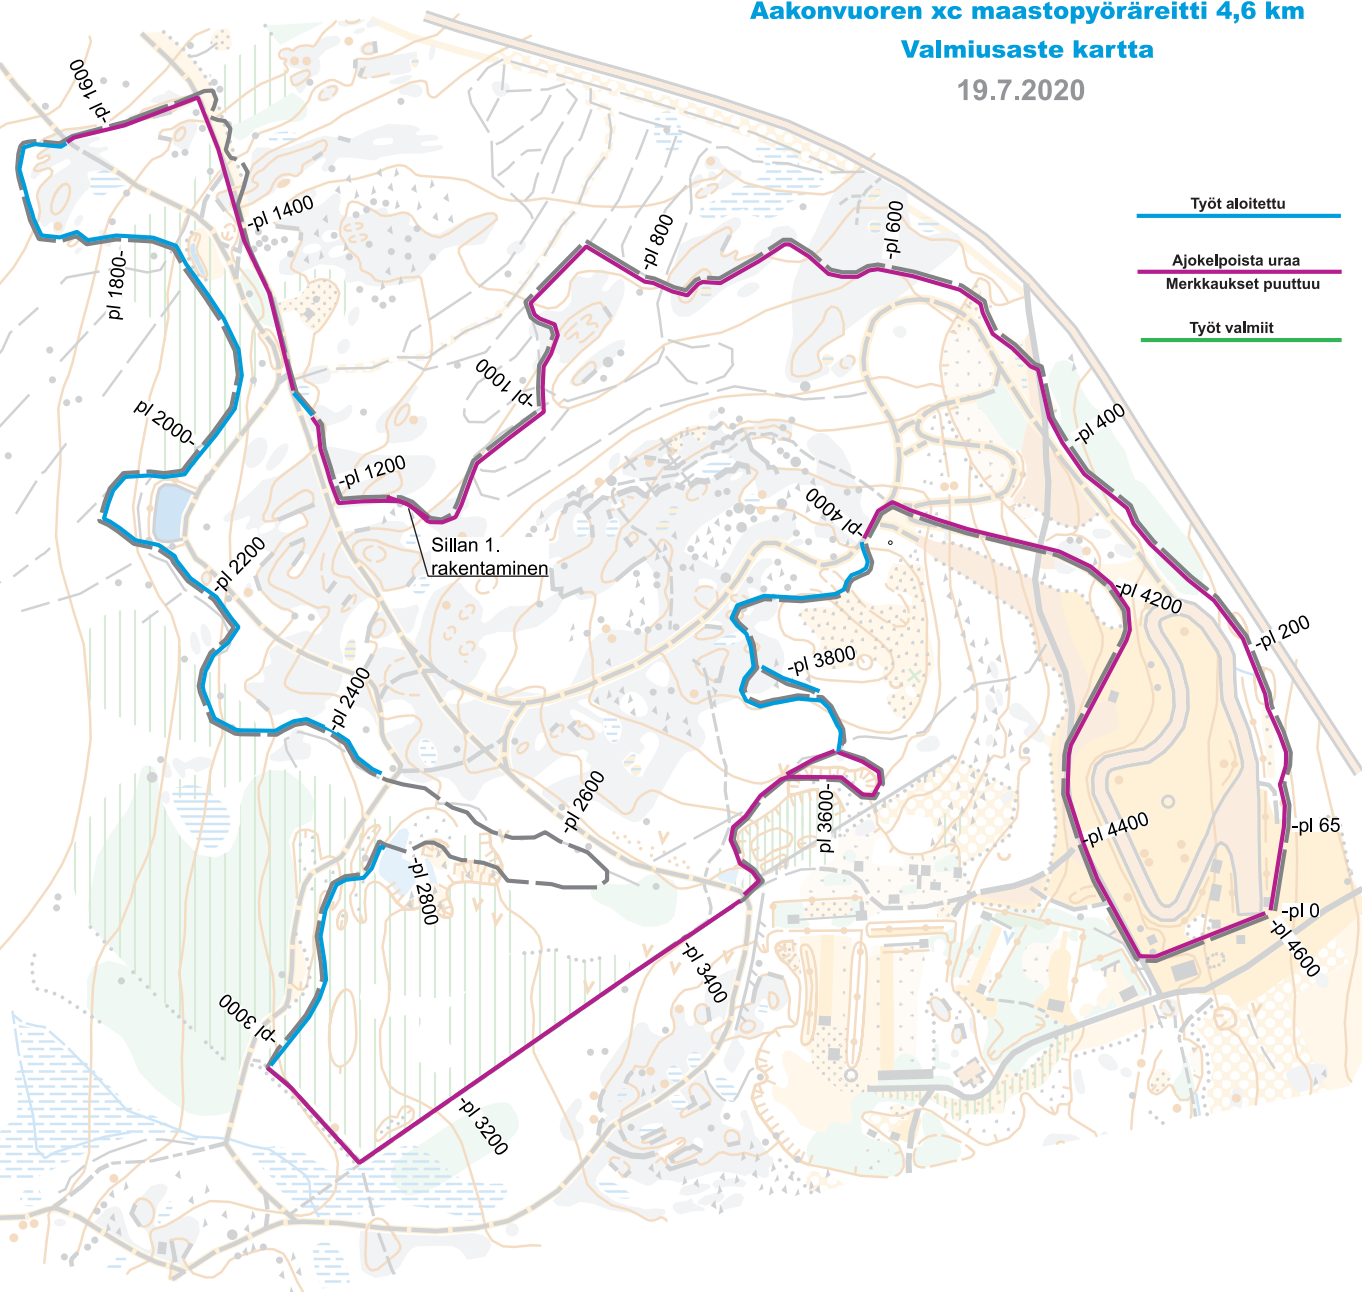

- Työt aloitettu
- Ajokelpoista uraa  
Merkkaukset puuttuu
- Työt valmiit

| Paalulukema    | Työselite   |
|----------------|---|
| 65-450         | Kaivurilla pohjan läpikäynti 3 metriä leveästi<br>Mursketta pintaan<br>Risujen poisto, ympäristön siistinen   |
| 470            | (4.) Sillan rakentaminen ojan ylitykseen. Pituus 4,5 metriä, leveys 1,6 metriä + täytemaata ja mursketta  |
| 450-500        | Kaivinkoneella pajukon poisto, uran muotoilu  |
| 790            | Pieni hyppyri este ja kierto reitti   |
| 500-1275       | Uran muodostaminen kuluttamalla, (mönkijä/motocross)<br>Risujen raivausta, kantojen sahaus matalammaksi, mursketta koloihin mönkijällä  |
| 750            | Pieni kallion ylitys rakennelma puusta/kivistä  |
| 550-1250       | Kalliolta sammaleen poisto  |
| 1125           | (4.) Kulkusillan rakentaminen puusta, pituus noin 30 metriä, leveys 1,6 metriä  |
| 1425-1525      | Lonkero mutkien rakentaminen kavinkoneella<br>Täytemaata 150-200m3+ mursketta pintaan   |
| 1525-1600      | Uran muodostaminen kuluttamalla, sammaleen poisto   |
| 1600-1630      | Kaivurilla pientä muotoilua, risujen raivausta, lyhyene pehmeikköön maata tai mursketta   |
| 1630-1700      | Kalliolta sammaleen poisto<br>Pientä kalliolokojen täyttöä murskeella, uran kulutus   |
| 1700-2450      | Pohjan tasaus kaivinkoneella, tarvittaessa mursketta<br>Risujen raivaus<br>Uran muodostaminen kuluttamalla, (mönkijä/motocross)   |
| 2450-2725      | Risujen raivaus, kantojen madallus<br>Uran muodostaminen kuluttamalla, (mönkijä/motocross)  |
| 1750/2100-2130 | Puun kaatoa   |
| 2725-2850      | Puiden kaatoa<br>Soramonttu, pohjan tasaus miestyönä<br>Tarvittaessa pintaan mursketta  |
| 2825           | (2.) Juhasillan rakentaminen puusta,<br>Kaivurilla kivistä perustuksia veteen<br>Sillan pituus 10 metriä, leveys 1,6 metriä   |
| 2850-3020      | Risujen raivaus, kantojen madallaminen<br>Uran muodostaminen kuluttamalla, (mönkijä/motocross)  |
| 3020-3100      | Valmis polku, pehmeisiin kohtiin mahdollisesti mursketta  |
| 3100-3450      | Valmis polku, uran leventäminen raivausehalla<br>Puiden alaokkien poistoa   |
| 3450-3500      | Puun kaato (3.) sillan teko ojan ylitykseen (2,5m)<br>Alku pehmeikköön kaivurilla murske täyttöä, mönkijällä mursketta koloihin<br>Uran muodostaminen kuluttamalla, (mönkijä/motocross) |
| 3500-3570      | Valmis metsäkoneura, risujen poistoa, kantojen madallus   |
| 3570-3700      | Teknisempi pätkä, vanhan soramontun pohjan tasaus miestyönä,<br>Samalle kohdalle myös oikaisupätkä  |
| 3700-4025      | Uran muodostaminen kuluttamalla, (mönkijä/motocross)<br>Mursketta koloihin  |
| 3800           | Teknisempi pätkä, miestyönä kivien asettelu, myös tasaisempi kiertoreitti   |
| 4000           | Frisbee radasta varoitus kyltti, samoin mahdollinen vauhdin himmaus kohta reitille  |
| 0-4600         | Uran merkkaukset maastoon   |
