


XC Aakonvuori

Maastopyöräreitti 5 km

Valmiusaste kartta

20.06.2021

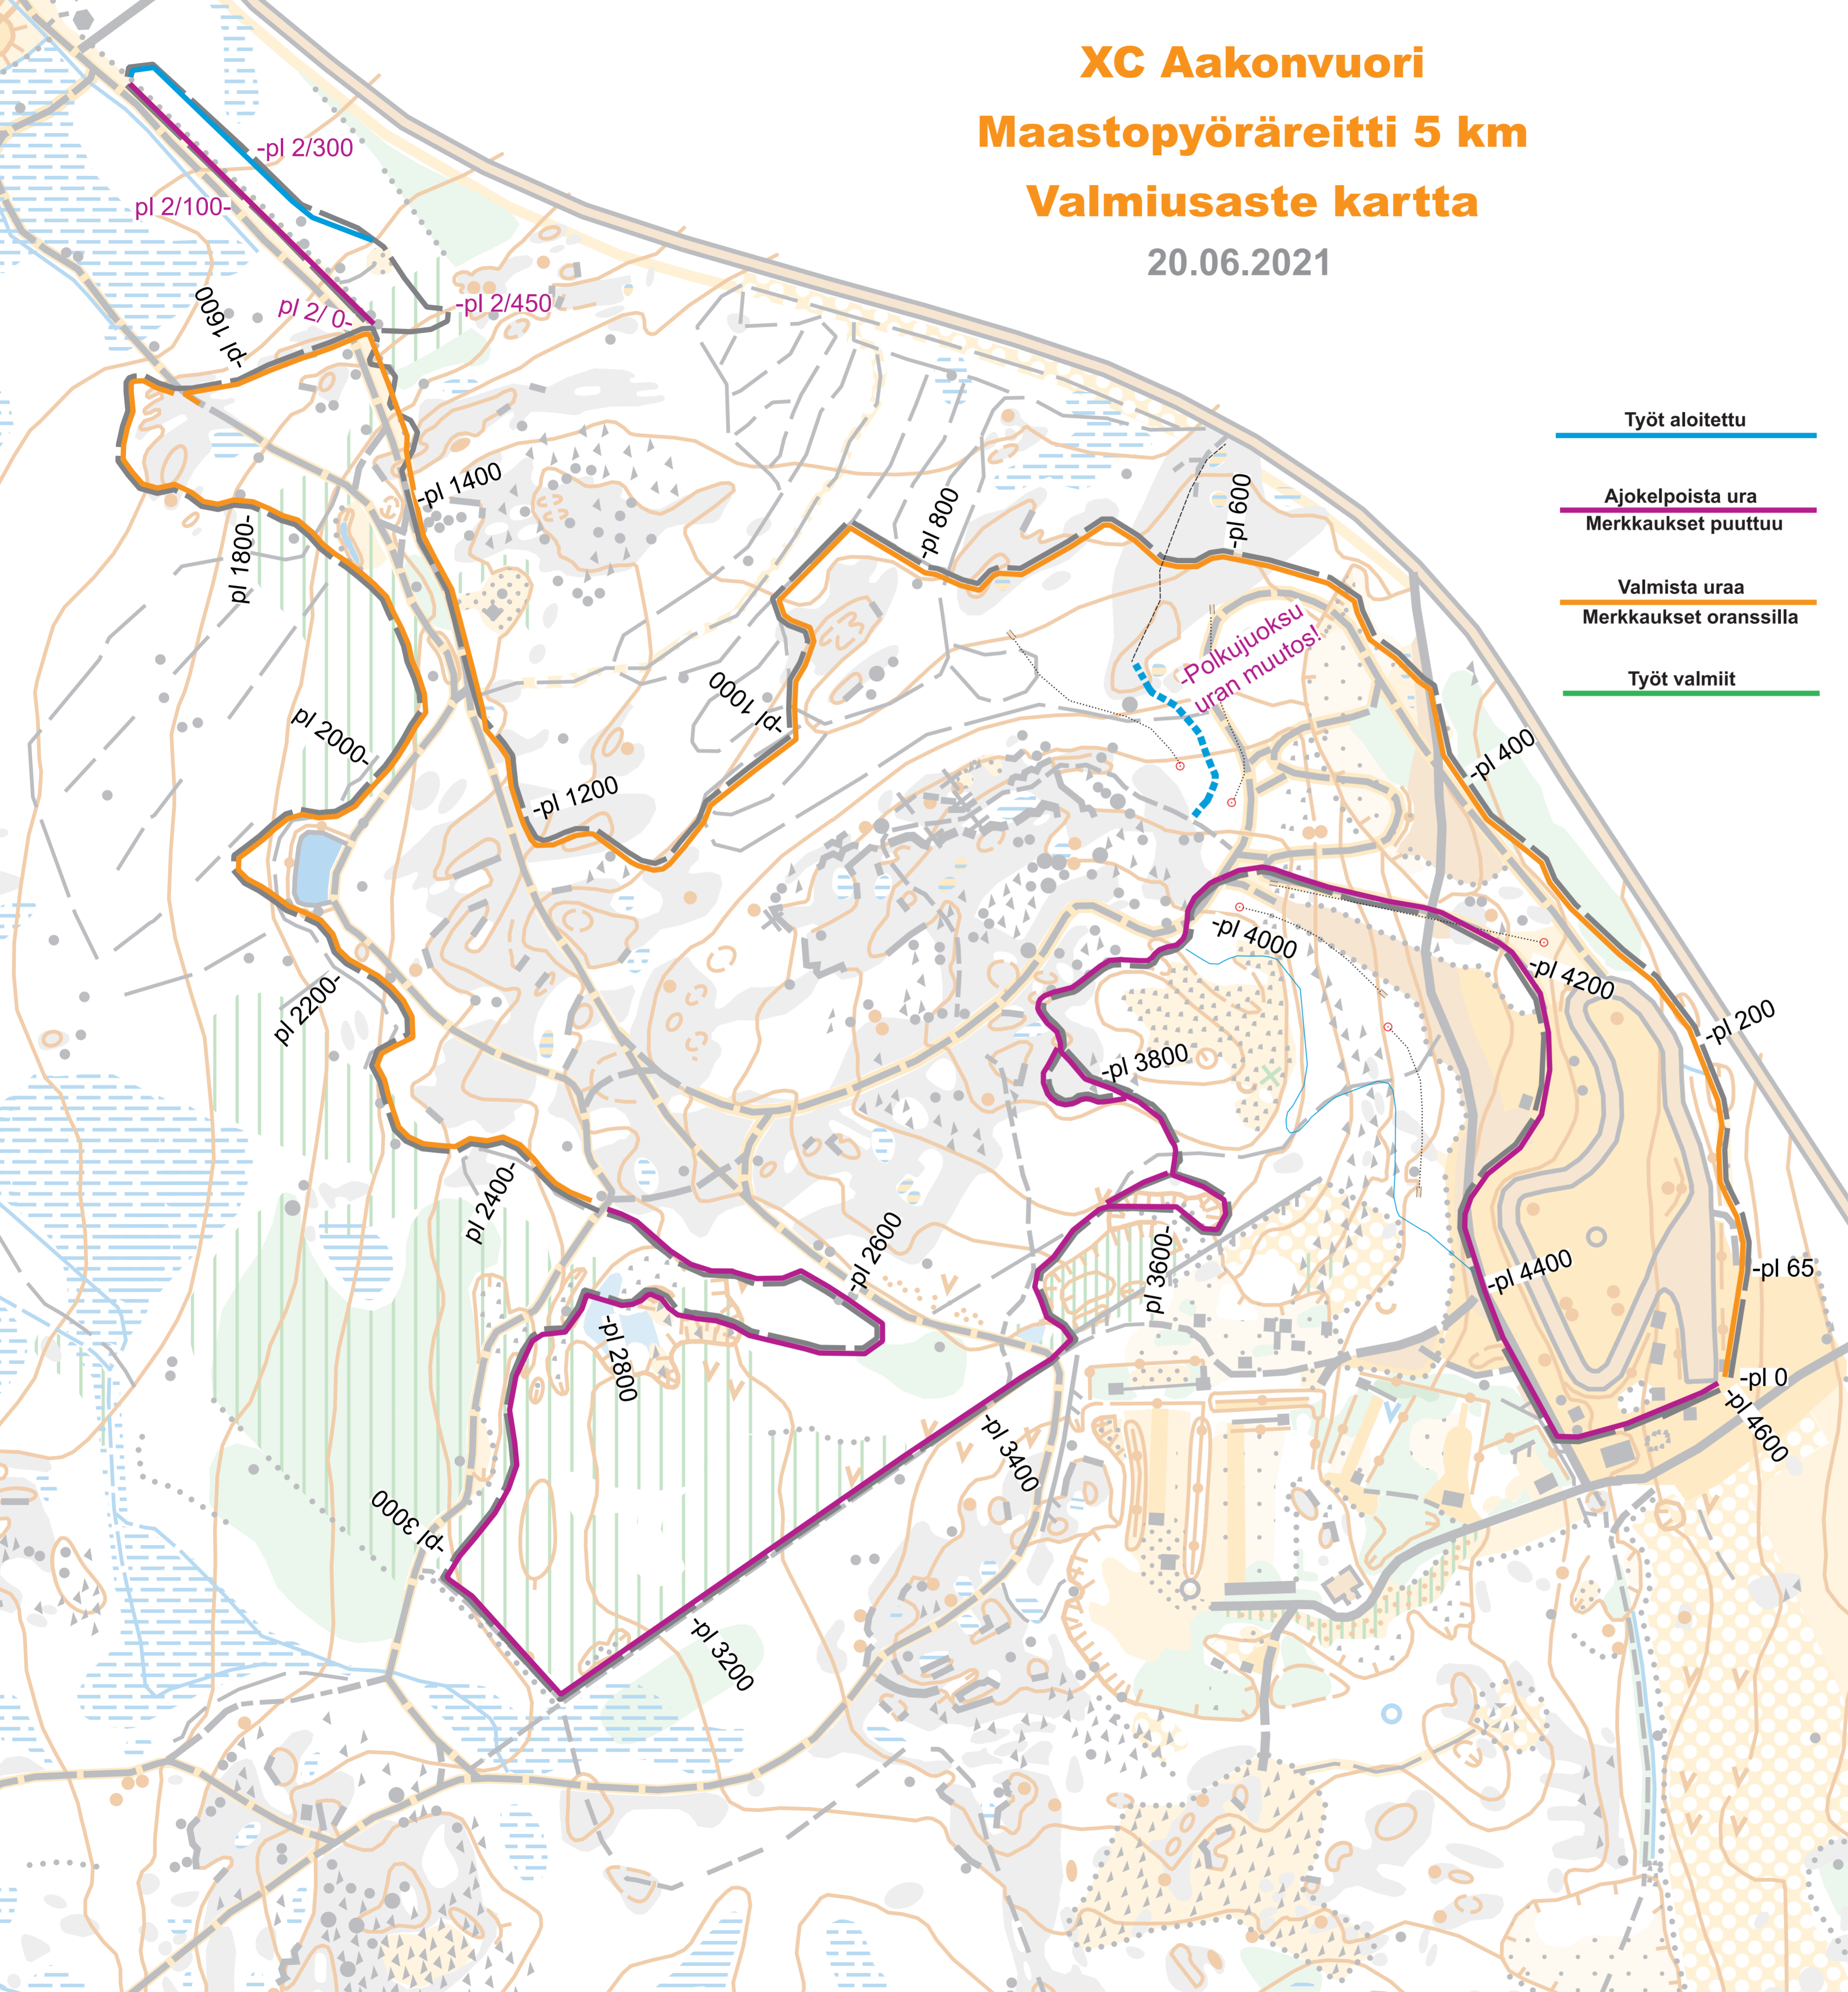

- Työt aloitettu
- Ajokelpoista ura
Merkkaukset puuttuu
- Valmista uraa
Merkkaukset oranssilla
- Työt valmiit

Paalulukema	Työselite
65-450	Kaivurilla pohjan läpikäynti 3 metriä leveästi Mursketta pintaan Risujen poisto, ympäryksien siistiminen
470	Sillan rakentaminen ojan ylityksen, Pituus 4,5 metriä, leveys 1,6 metriä + täytemaata ja mursketta
450-500	Kaivinkoneella pajukon poisto, uran muotoilu
790	Pieni hyppyrieste ja kiertoreitti
500-1275	Uran muodostaminen kuluttamalla, (mönkijä/motocross) Risujen raivausta, kantojen sahaus matalammaksi, mursketta koloihin mönkijällä
750	Pieni kallion ylitys rakennelma puusta/kivistä
950	Kalliolta sammaleen poisto
1125	(1.) Kulkusuillan rakentaminen puusta, pituus noin 30 metriä, leveys 1,6 metriä
1250-1270	Pitkospuiden rakentaminen lyhyeen pehmeikköön
1270-1525	Ura kulkee hiihtolatua pitkin, mahdollinen reitin teko ladun viereen
1425-1525	Uran muodostaminen kuluttamalla, (mönkijä/motocross)
1525-1600	Uran muodostaminen kuluttamalla, sammaleen poisto
1600-1630	Kaivurilla pientä muotoilua, risukon raivaus, lyheen pehmeikköön maata tai mursketta
1630-1700	Kalliolta sammaleen poisto Pientä kalliokehojen täyttöä murskeella, uran kulutus
1700-2450	Pohjan tasaus kaivinkoneella, märkien kohtien kuivatus, tarvittaessa mursketta, Risujen raivaus Uran muodostaminen kuluttamalla, (mönkijä/motocross)
2450-2725	Risujen raivaus, kantojen madallus Uran muodostaminen kuluttamalla, (mönkijä/motocross)
1750/2100-2130	Puun kaatoa
2725-2850	Puiden kaatoa Soramonttu, pohjan tasaus miestyönä Tarvittaessa pintaan mursketta
2825	(2.) Juhasillan rakentaminen puusta, Kaivurilla kivistä perustuksia veteen Sillan pituus 10 metriä, leveys 1,6 metriä
2850-3020	Risujen raivaus, kantojen madaltaminen Uran muodostaminen kuluttamalla, (mönkijä/motocross)
3020-3100	Valmis polku, pehmeisiin kohtiin mahdollisesti mursketta
3100-3450	Valmis polku, uran leventäminen raivausahalla Puiden alaoksien poistoa
3450-3500	Puun kaato ja pienehkön (3.) sillan teko Alku pehmeikköön kaivurilla murske täyttöä, mönkijällä mursketta koloihin Uran muodostaminen kuluttamalla, (mönkijä/motocross)
3500-3570	Valmis metsäkoneura, risujen poistoa, kantojen madallus
3570-3700	Teknisempi pätkä, vanhan soramontun pohjan tasaus miestyönä, Samalle kohdalle myös oikaisupätkä
3700-4025	Uran muodostaminen kuluttamalla, (mönkijä/motocross) Muraketta koloihin
3800	Teknisempi pätkä, miestyönä kivien asettelu, myös tasaisempi kiertoreitti Mursketta koloihin
4000	Frisbee radasta varoitus kyltti
0-4600	Uran merkkkaus maastoon
0-4600	Opasteet, kartat, viimeistelyt

Lisälennkki	
2/ 0-200	Kaivurilla täytemaista kumpareiden muotoilu, murske pinnoitus
2/ 200-500	Risujen ja kanavikon raivaus, kantojen madaltaminen Uran muodostaminen kuluttamalla, (mönkijä/motocross)
2/ 0	Yli-ali sillan rakennus, kaivurilla maapenkkojen muotoilut ja pylväiden pystytys
2/ 0-500	Uran merkkkaus maastoon opasteet, kartat, viimeistelyt
