


Aakonmajan maastopyöräreitti 4,6 km

Valmiusaste kartta

4.7.2020

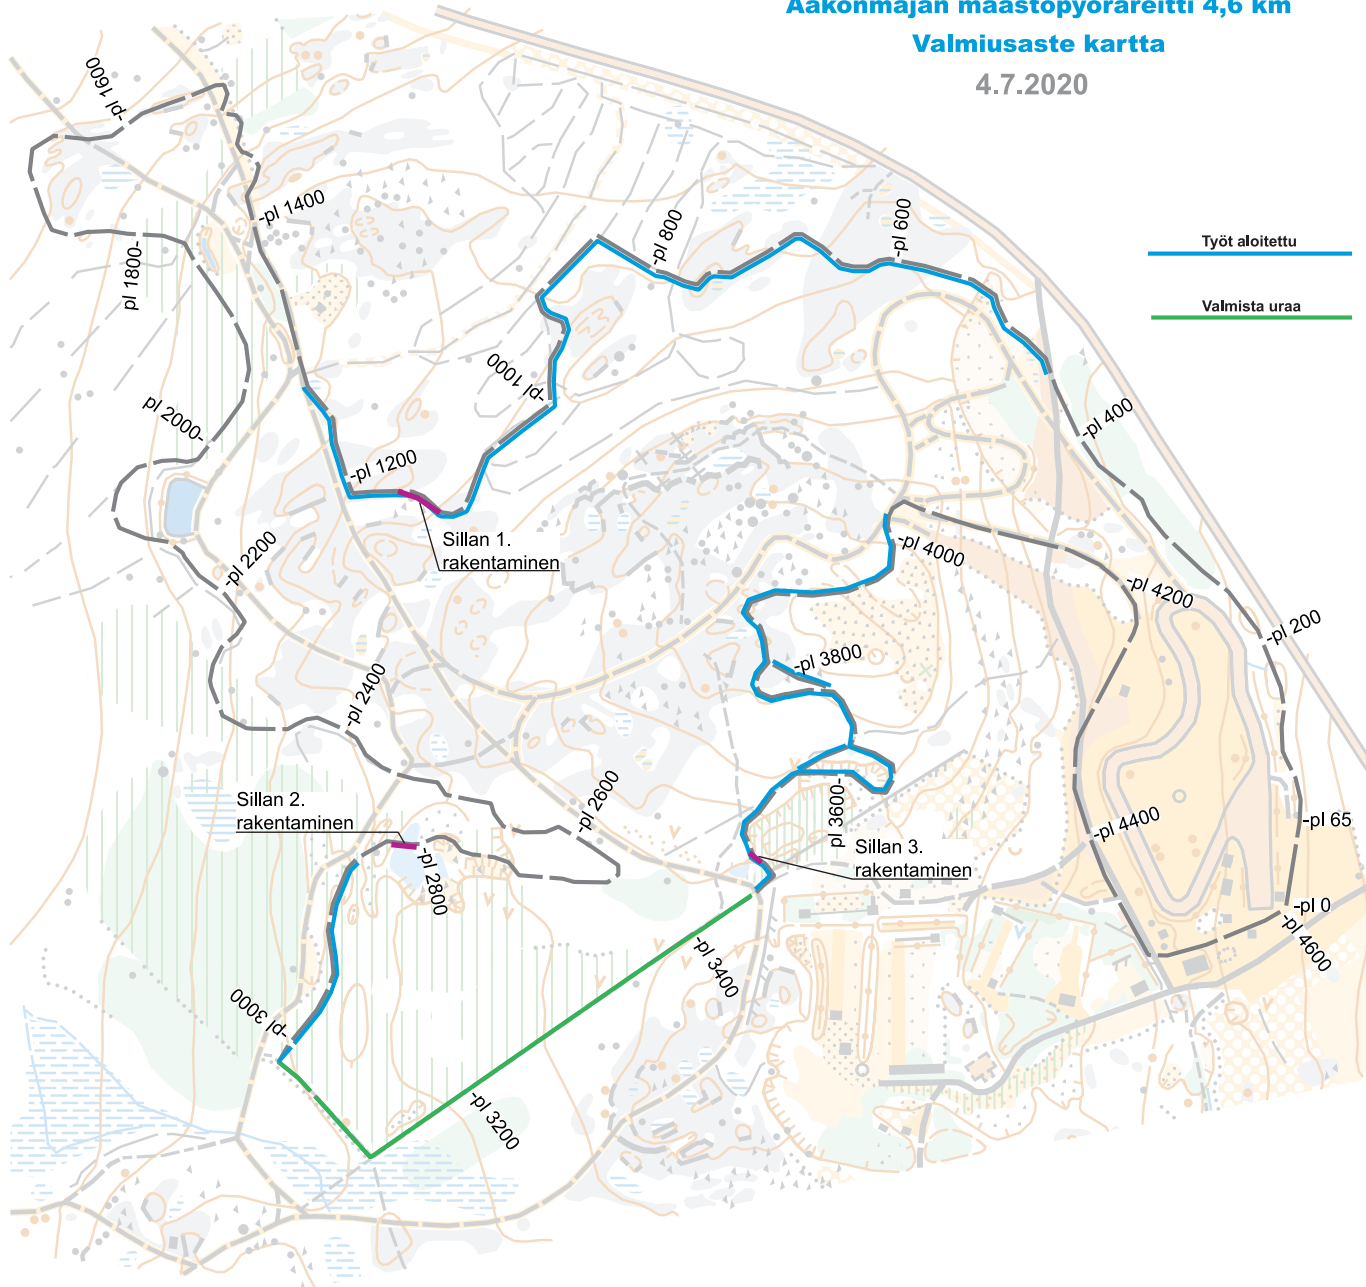

Työt aloitettu
Valmista uraa

Paalulukema	Työselite
65-450	Kaivurilla pohjan läpikäynti 3 metriä leveästi Mursketta pintaan
470	Rumpu kosteikon ylitykseen + täytemaata ja mursketta
450-500	Kaivinkoneella pajukon poisto, uran muotoilu
500-1275	Uran muodostaminen kuluttamalla , (mönkijä/motocross) Risujen raivausta, kantojen sahaus matalammaksi , mursketta koloihin mönkijällä
750	Pieni kallion ylitys rakennelma puusta/kivistä
950	Kalliolta sammaleen poisto
1125	(1.) Kulkusillan rakentaminen puusta, pituus noin 30 metriä, leveys ?
1425-1525	Lonkero mutkien rakentaminen kaivinkoneella Täytemaata 150-200m3+ mursketta pintaan
1525-1600	Uran muodostaminen kuluttamalla, sammaleen poisto
1600-1630	Kaivurilla pientä muotoilua, lyheen pehmeikköön maata tai mursketta
1630-1670	Kalliolta sammaleen poisto Pientä kalliokolojen täyttöä murskeella
1670-2650	Pohjan tasaus kaivinkoneella, tarvittaessa mursketta Kantojen lyhentäminen sahaamalla Uran muodostaminen kuluttamalla, (mönkijä/motocross)
2650-2725	Uran muodostaminen kuluttamalla, (mönkijä/motocross)
1750/2100-2130	Puun kaatoa
2725-2850	Puiden kaatoa Pohjan tasaus kaivinkoneella olemassa olevaa sorakkoa hyödyntäen Tarvittaessa pintaan mursketta
2825	(2.) Juhasillan rakentaminen puusta, Kaivurilla kivistä perustuksia veteen Sillan pituus 10 metriä, leveys ?
2850-3020	Risujen raivaus , kantojen madaltaminen Uran muodostaminen kuluttamalla, (mönkijä/motocross)
3020-3100	Valmis polku , pehmeisiin kohtiin mahdollisesti mursketta
3100-3450	Valmis polku, uran leventäminen raivaussahalla Puiden ala-osaisten poistoa
3450-3500	Puun kaato ja pienehkön (3.) sillan teko Alku pehmeikköön kaivurilla murske täyttöä Uran muodostaminen kuluttamalla , (mönkijä/motocross)
3500-3570	Valmis metsäkoneura, risujen poistoa, kantojen madallus
3570-3700	Teknisempi pätkä, vanhan soramontun pohjan tasaus miestyönä , Samalle kohdalle myös oikaisupätkä
3700-4025	Uran muodostaminen kuluttamalla , (mönkijä/motocross) Muraketta koloihin
3800	Teknisempi pätkä , miestyönä kiven asettelu, myös tasaisempi kiertoreitti
4000	Frisbee radasta varoitus kyltti, samoin mahdollinen vauhdin himmaus kohta reitille
0-4600	Uran merkkkaus maastoon
